⓪ 로뎀카페 공간 · 기물 치수 한눈에 보기 — 2026-11-04

단위 mm · 파란 글씨 = 도면 값 · 회색 = 견적 기종 치수 · 빨간 글씨 = 확인할 것 · 그림 ①~⑫의 기준

1. 공간 — 벽 · 정면 (도면)

출처: ELE.01 REV.3(10/09) · ELE.02·02' REV.5(10/21) · ELE.03 REV.4(10/21) · ELE.04 · 실시설계 평면 11/3

곳	전체 길이	구간(왼쪽부터)	높이	확인할 것
정면(출입구 벽) ELE.01	13,616	1,246 · 1,610 · 2,039(LED) · 1,000 · 3,429(자동문) · 2,000 · 2,292	유리 2,249 + 200 + 루버 1,014 + 상부 800 = 4,263	현황판 "가운데" 기준 · 높이 · 콘센트
앞 바 손님 쪽 ELE.02	9,645	루버 벽 2,450(LED 선 253 · 키오스크 매립 450 · 기기 W410) + 7,195(쇼케이스 1,230 · 루버 바 5,065 · 900)	대리석 449 · 앞 바 1,050 · 메뉴판 1,842~2,400 · 사인 띠 2,400~2,850 · 루버 613	오른쪽 900 · 1,124 점선
뒤 바 벽 ELE.02'	9,995	2,870 + 7,125 · 하부장(1200 냉장고 · 900 냉동고 · 752 제빙기) · 콘센트 간격 285 · 1,950 · 830 · 918 · 1,725 · 900	하부장 924 · 콘센트 상판 위 200 · 메뉴판 상판 위 997 · 상부 800	하부장 칸 너비(도면 치수 없음)
끝 벽(서비스바 쪽) ELE.04	9,313	1,878 · 갤러리 도어 805 · 5,223 | 120 · 갤러리 도어 1,287 · 323	쇼파 450 + 700 + 1,713 · 루버 600 · 상부 800	쇼파 길이 · 냉난방 자리
창 쪽 벽 ELE.03	16,416	타일 1,290 · 2,208 · 창 1,670 · 창 6,088 · 창 1,695 · 2,220 · 패브릭 1,245	창 450 + 2,400 + 80 + 963 · 상부 800	테이블 배치
홀(평면)	정면 23,013	5,992 · 283 · LED 2,039 · 유리 6,399 · LED 2,039 · 1,612	129.5㎡ · 4인 테이블 16	—

2. 바 — 평면 (11/3 실시설계) · 칸 (3D 시안)

곳	폭 × 길이	칸 (왼쪽부터)	상판 위 (순서)	확인할 것
앞 바	875 × 6,295	도면 1,230 · 1,100 · 400 · 1,250 · 800 · 1,215 (사이 60×5) / 3D 500 · 868 · 800 · 1,250 · 400 · 500 · 500 · 1,230 · 50	쇼케이스 → ORDER(POS) → 템핑 · 그라인더 → 하부냉장고 → 하부제빙기 → PICK UP · RETURN	높이 1,050(도면) / 860(3D) · 커피머신 어느 바
뒤 바	775 × 길이 표기 없음	3D 600 · 950(싱크) · 400 · 350 · 1,250 · 450 · 950 · 736 · 889(제빙기) / 도면 하부장 285 · 1,950 · 830 · 918 · 1,725 · 900	싱크 → 그라인더 · 템핑 · 넉박스 → 커피머신 · 온수기 → 믹서기 2 → 싱크 (싱크 사이 4,638 · 벽에서 250)	전체 길이 · 상부 선반 없음
바 안 통로	1,150	—	—	—
서비스바(섬)	4,200(도면) × 폭 700(스케치)	세척 2구 → 음료 버림 → 투입구 4 → 아이스크림 냉동고	앞 바에서 1,600 · 뒤 바 싱크에서 급배수 4,820 · 급배수 3곳	폭 700/600 · 높이
간이주방	2,870 × 2,300	50 · 냉동(장)고 자리 800×1,250 · 빈 공간 1,120 · 슬라이딩 도어 900 · 기둥 550 바깥 · 분전함	슬라이딩 도어(통로 끝 측면) · 창고와 문 없이 뚫림	냉동고 1,260 vs 자리 1,250 · 바 쪽 문 자물쇠
창고	1,670 × 1,971	323 · 앵글장 398 · 1,250 · 왼쪽 벽 문 875(밖으로)	오른쪽 = 간이주방으로 뚫림 · 아무것도 안 둠	선반 자리 · 자물쇠

3. 기물 — 가로 × 깊이 × 높이 (10/20 견적 기종 · 치수만)


기물	치수	수량	자리 (칸)	확인할 것
커피머신 란실리오 Classe 7 3그룹	990 × 540 × 540	1 (+기존 1?)	도면 자리 900×700 · 3D 칸 1,250	990 > 도면 900 · ELE.02' OPEN 830 · 어느 바
그라인더 체아도 E37S	212 × 309 × 557	3	앞 바 · 뒤 바	—
넉박스 거치형	150 × 160 × 130	1	상판 (타공 없음)	—
온수기 진성 JS-1	243 × 353 × 553	2	뒤 바 · 앞 바(기존)	—
쇼케이스 세경냉동 1200	1,200 × 650 × 1,200	1	앞 바 끝 칸 1,230 — 들어감	개폐형 상판
테이블 냉장고 (기존) 1200 2도어	1,200 × 700 × 800	2	앞 바 칸 1,250 · 뒤 바 칸 1,250 — 들어감	방열 방향
제빙기 언더카운터 아이스트로 ICIS 105w	760 × 680 × 850	1	앞 바 칸 800 — 들어감 (높이 850 / 하부 확인)	상판 높이
4도어 냉동(장)고 그랜드우성 CWSM-1242RF	1,260 × 800 × 1,900	1	간이주방 자리 800×1,250 — 세로로	1,260 > 자리 1,250
아이스크림 냉동고 (후보 매직 MC-460F1)	640 × 565 × 1,849	1	서비스바 끝	−18℃ · 기종 · 별도 구매
스무디머신 티아모 MAX	295 × 260 × 530	3 (기존 2)	뒤 바	기존 기종 확인
디스플레이 43″ 메뉴판	957 × 553	3	뒤 바 위 1,842~2,400 (2,910)	기종 · 거는 방식
디스플레이 43″ 주문현황판	957 × 553	1	정면 벽 안쪽 가운데 위 (루버 띠)	가운데 기준 · 콘센트
키오스크 (벽면 매립)	450 × 1,040 (매립)	1	쇼케이스 옆 루버 벽 760~1,800 · 기기 W410	기종
다회용컵 반납함 (더그리트)	치수 확인	5	1층 카페 3 · 3층 1 · 5층 1 (안)	자리 — 단장님
텀블러 세척기 (피처린서 매립)	—	2구	서비스바	급배수

4. 사람 기준 (그림에 넣을 때)

여 160cm · 남 175cm · 앞치마 검정 — 앞 바 1,050이면 160cm 어른 가슴 아래


① 로뎀카페 홀 전체 — 11/3 최종 도면 기준

단위 mm · 위에서 본 모습 · 129.5㎡ · 4인 테이블 16 + 벽 바석 10 · 파란 글씨 = 도면 값 · 테이블 세로 위치 · 벽 바석 치수는 도면 비율

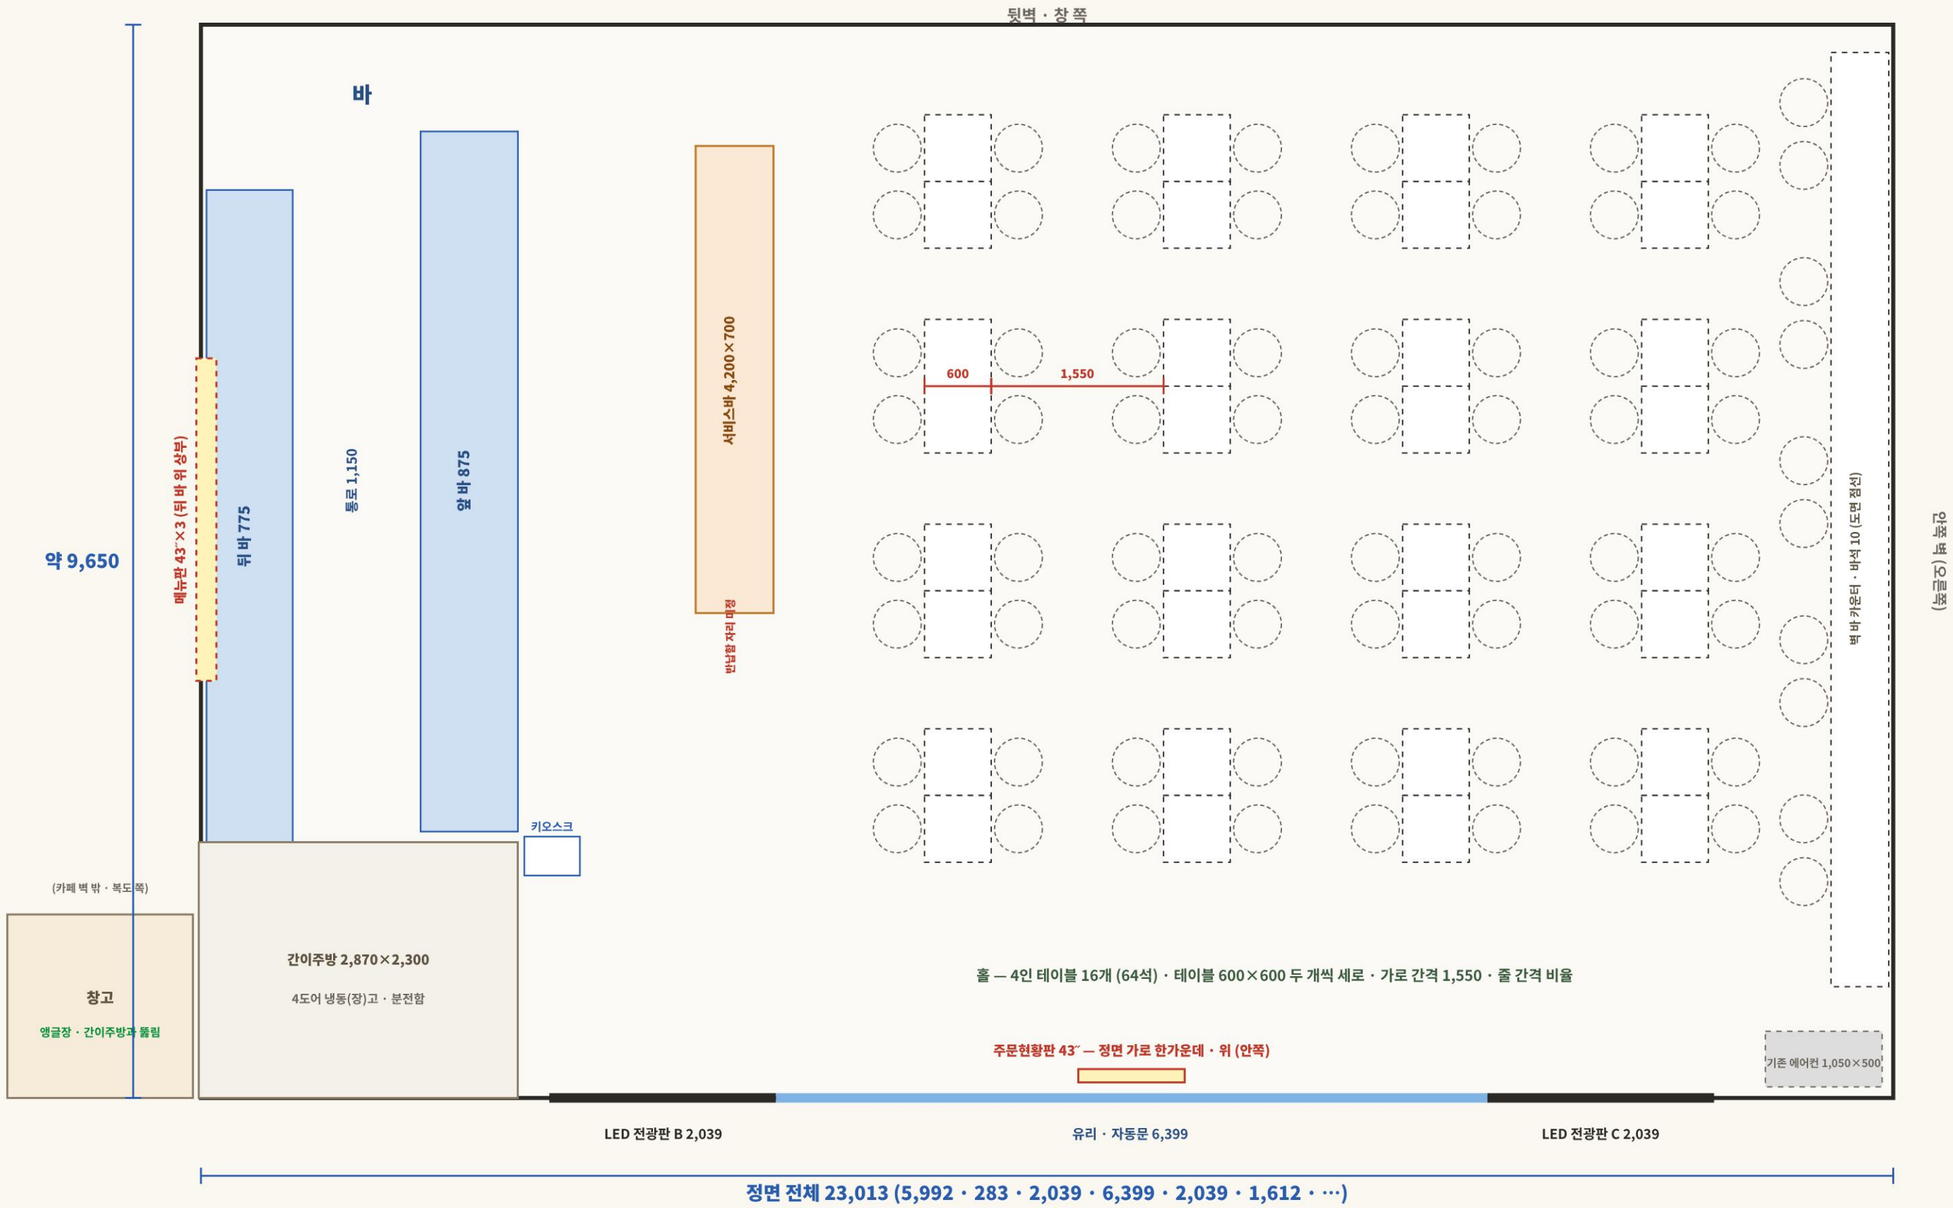

② 앞 바 — 손님이 보는 모습 · 도면 ELE.02 REV.5 (10/21) 치수

단위 mm · 전체 9,645 = 루버 벽 2,450 + 7,195 · 높이 4,263 = 3,463 + 상부 800 · 앞 바 높이 1,050 · 메뉴판 43″ 3대 970×558 · 사인 띠 450

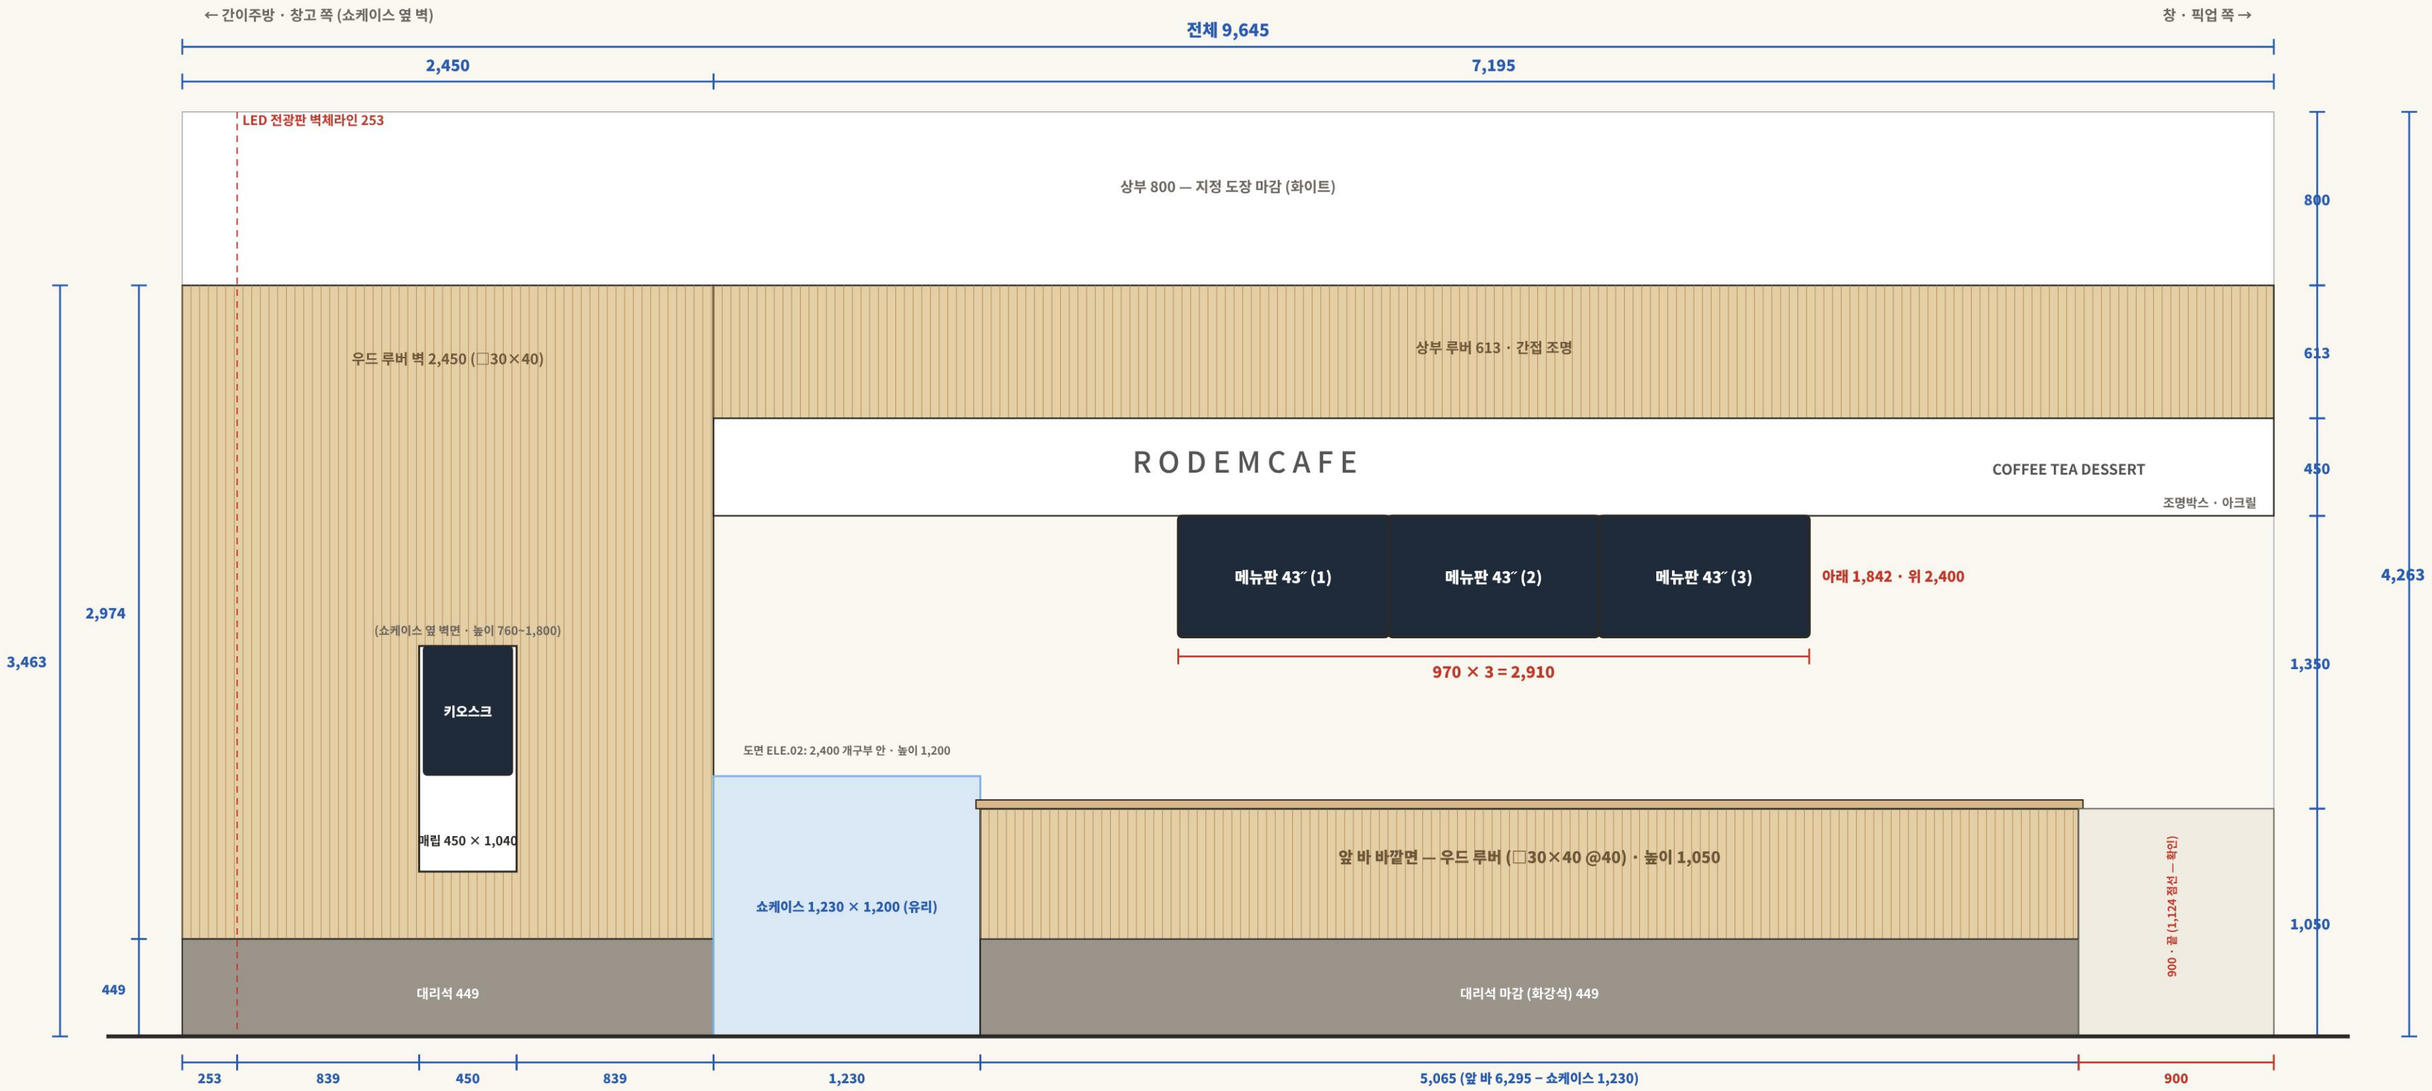


도면 ELE.02 REV.5(10/21): 9,645 = 루버 벽 2,450(LED 벽체라인 253 · 키오스크 매립 450 · 기기 W410) + 7,195(쇼케이스 1,230 · 루버 바 · 900) — 높이 3,463 = 대리석 449 + 앞 바 1,050 + 1,350(메뉴판 1,842~2,400) + 사인 띠 450 + 루버 613, 위 800

확인: 쇼케이스 아래도 루버·대리석이 덮고 지나가는지 · 오른쪽 끝 900 구간과 1,124 점선 · 키오스크 기기 W410

③ 카페 안에서 본 정면(출입구 벽) · 주문현황판 — 도면 REV.3 (10/09) 치수

단위 mm · 로비에서 본 입면도를 안쪽에서 보는 모습으로 좌우 뒤집음 · 13,616 × 4,263 · 유리 7,429 (자동문 970 ×3 · FIX 3,369 · FIX 1,000) · 주문현황판 43″ 안쪽 벽 가운데 위

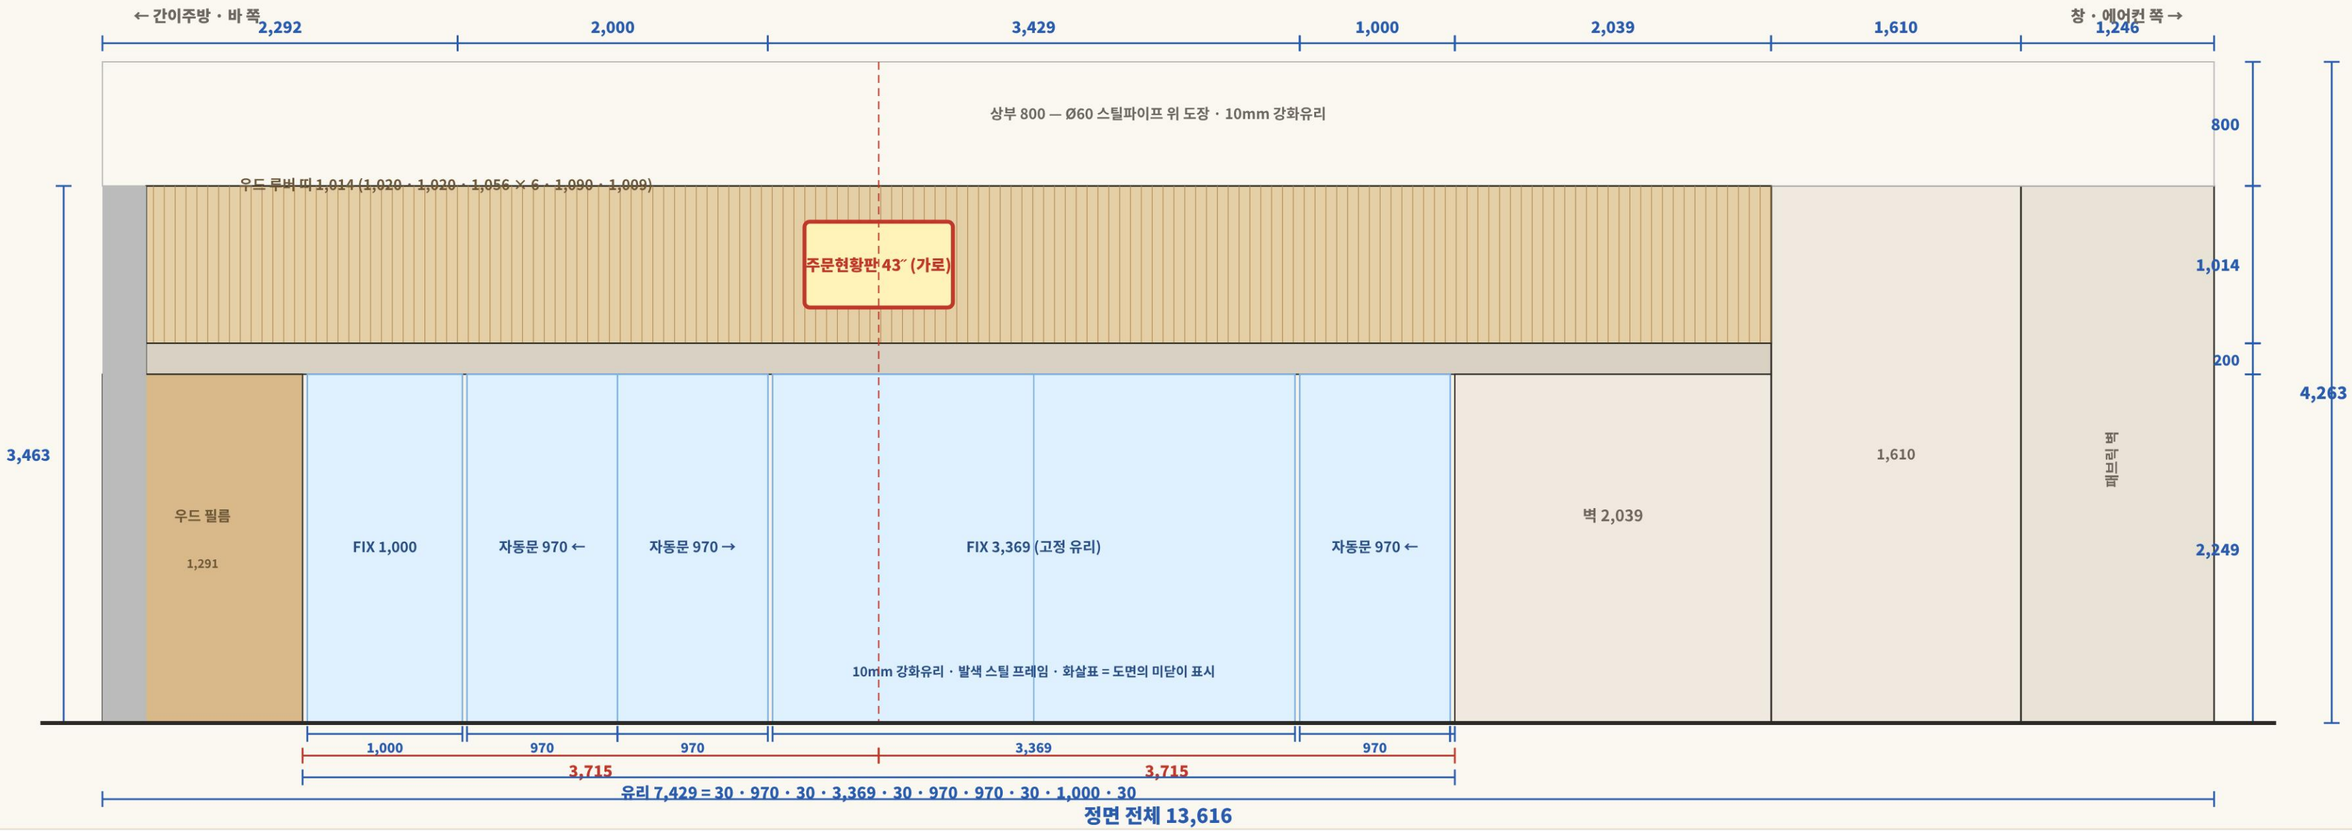

도면 REV.3(10/09) 카페출입구 입면도: 13,616 = 1,246 · 1,610 · 2,039 · 1,000 · 3,429 · 2,000 · 2,292 · 유리 7,429: 자동문 970 → | FIX 3,369 | 자동문 970 ← · 970 → | FIX 1,000 — 높이 4,263 = 유리 2,249 + 200 + 루버 1,014 + 상부 800

11/3 결정: 주문현황판 43″ · 카페 안쪽 벽 · 가운데 위 (루버 띠 안, 바닥에서 약 2,680) · 가로 · 픽업존 아님

확인: "가운데" = 유리 7,429 가운데(그림) / FIX 3,369 가운데 / 정면 전체 가운데 — 자동문이 970 세 짝(도면 화살표)인지 · 루버 보강 · 콘센트 · 와이파이 · 사이니지 스틱

로뎀카페 서비스바 (안) — 11/2 회의 스케치 + 11/3 최종 도면

단위 mm · 치수는 11/3 최종 도면(4,200 × 700) · 구성은 11/2 회의 스케치 · 빨간 글씨 = 정할 것 · 구간 너비는 임의

① 위에서 본 모습



② 손님 쪽에서 본 모습 (정면)




스케치: 왼쪽 텀블러 세척 2구(확정) → 음료 버리는 곳(둥근 구멍 · 아래 물통) → 상판 투입구 4개(일반 쓰레기 · 재활용 종이 · 플라스틱 · 다회용컵) → 끝 블록 · 아래 수납(문) · 셀프 코너 2단 선반

도면: 길이 4,200 · 폭 700 · 앞 바에서 1,600 · 기둥에서 두 번째 세척 구멍까지 1,790 · 아이스크림 냉장고 자리 · (도면 동그라미 3개는 2구로 수정 요청)

정할 것: 폭 700(도면) / 600(업체 권장) · 높이 · 다회용컵을 상판 투입구로 받는지, 더그리트 반납함을 옆에 따로 두는지 · 셀프 선반 깊이


구간 너비는 임의 배분(도면에 구간 치수 없음) · 정면 모습은 형태 설명용 스케치

③ 11/2 회의 때 그린 스케치 (원본)

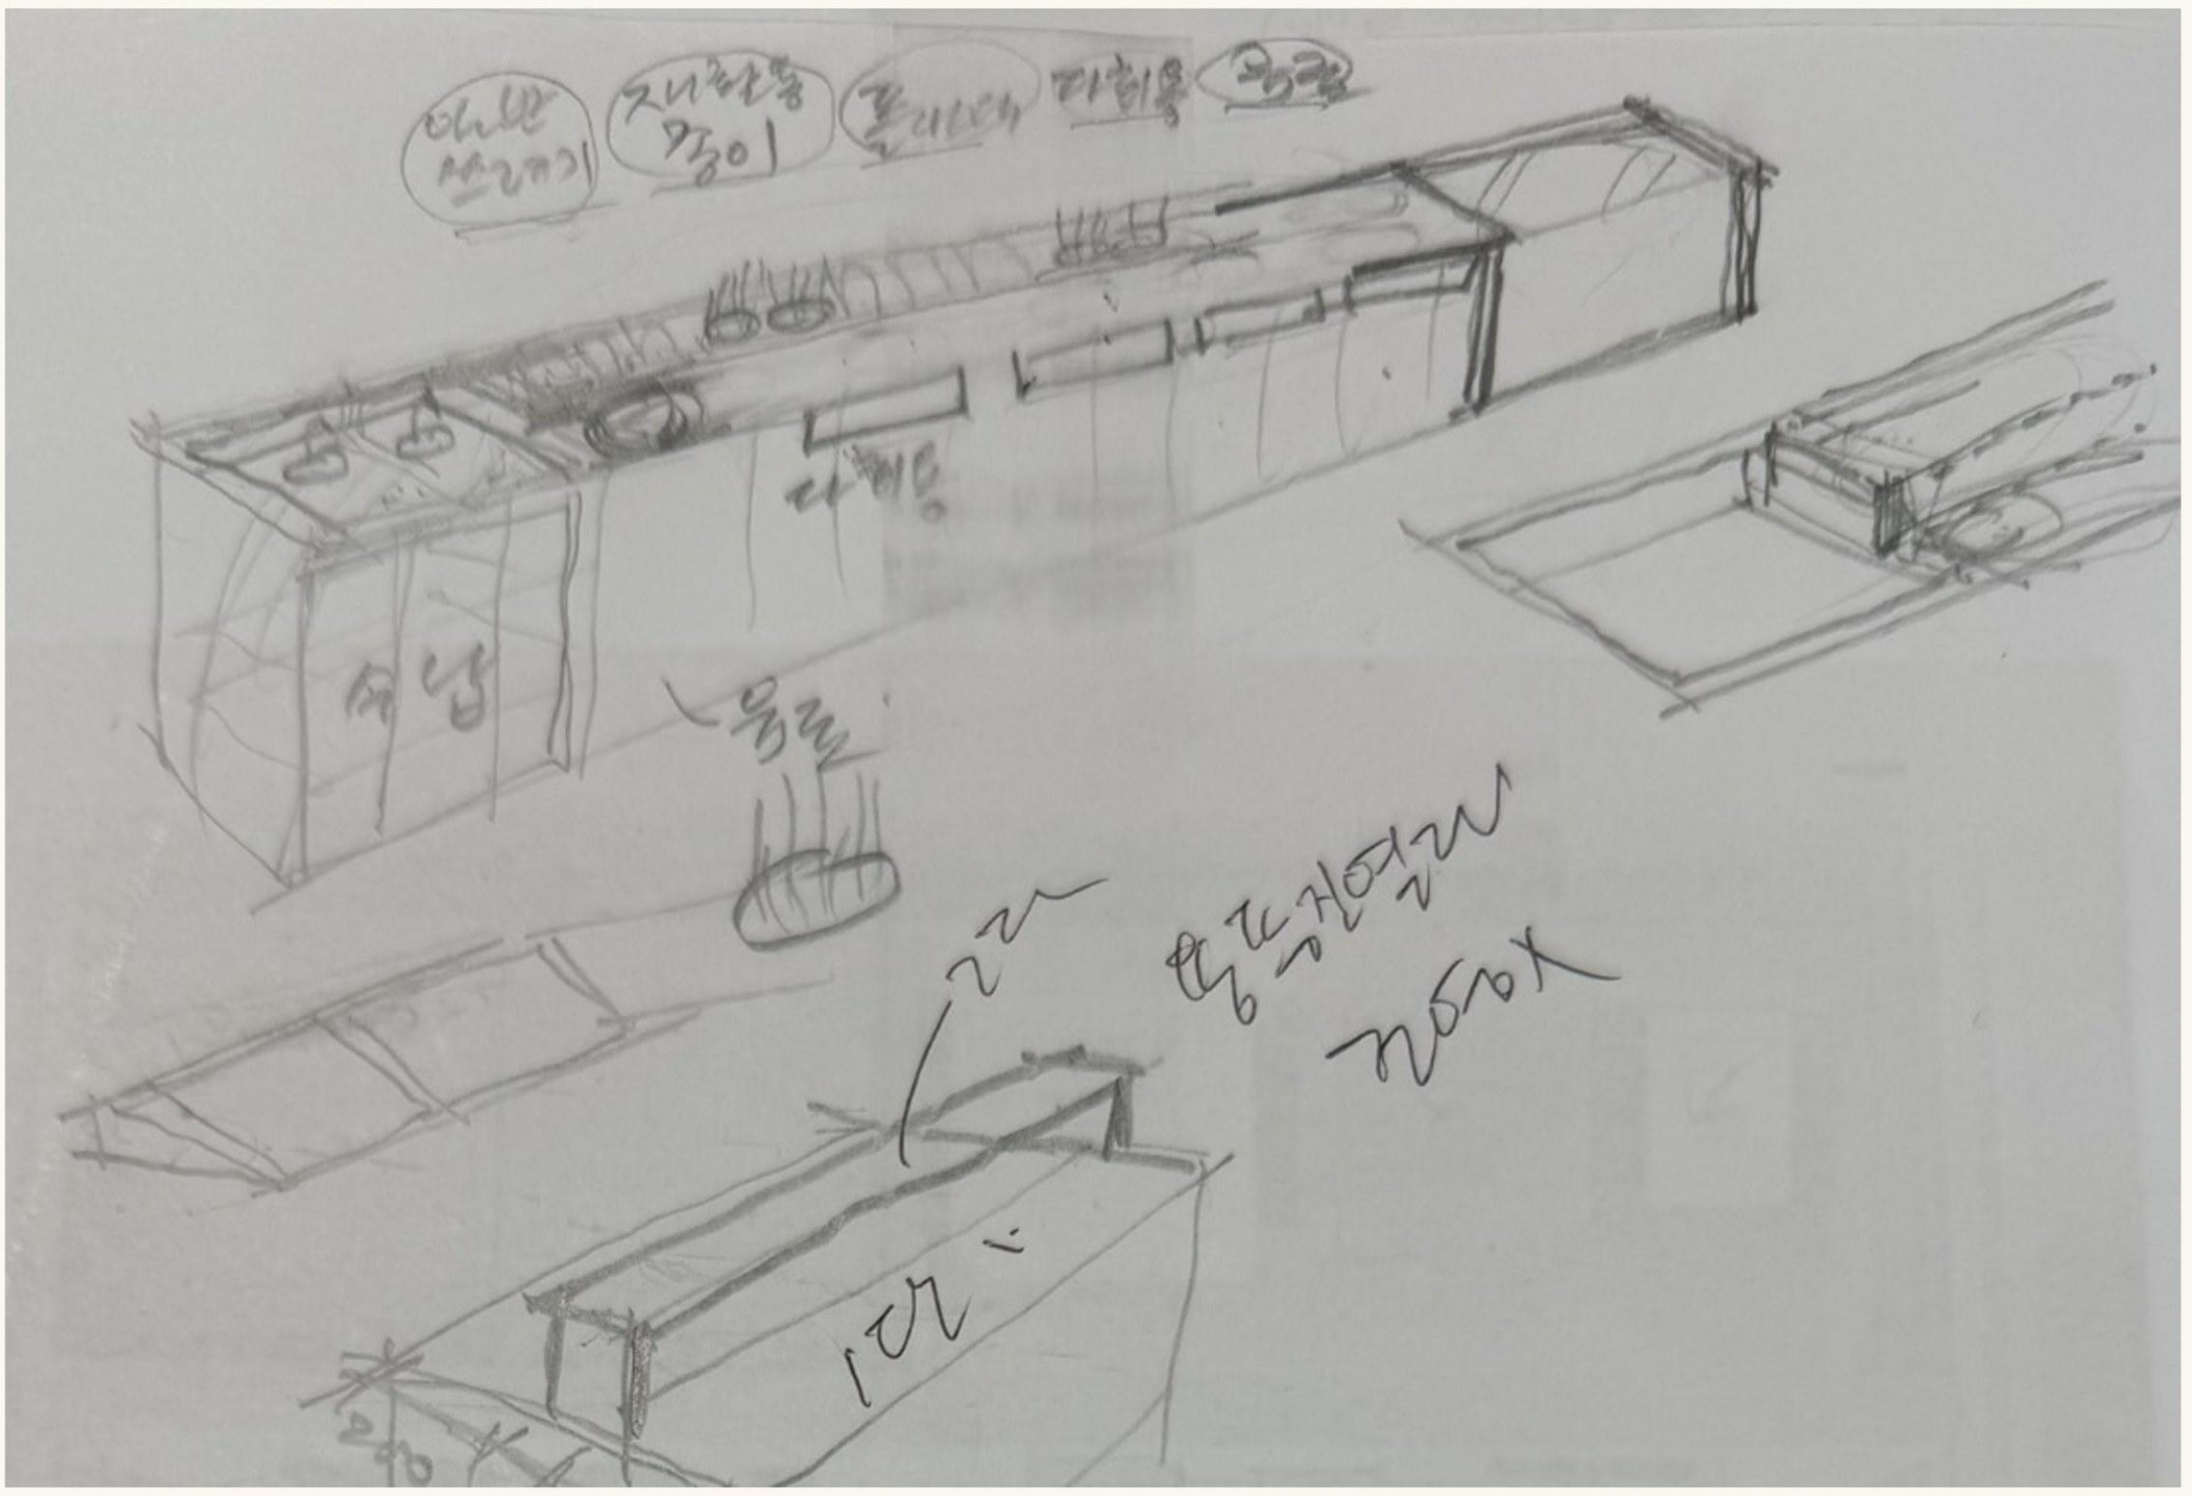

⑤ 앞 바 · 뒤 바 · 서비스바 — 위에서 본 평면 (11/3 실시설계 평면 기준)

단위 mm · 왼쪽이 뒤 바(벽 쪽) · 가운데 앞 바 · 오른쪽 서비스바(섬) · 파란 점 = 급배수 자리 · 빨간 숫자 = 도면 표기 치수 · 위가 창 쪽 · 아래가 정면(출입구) 쪽

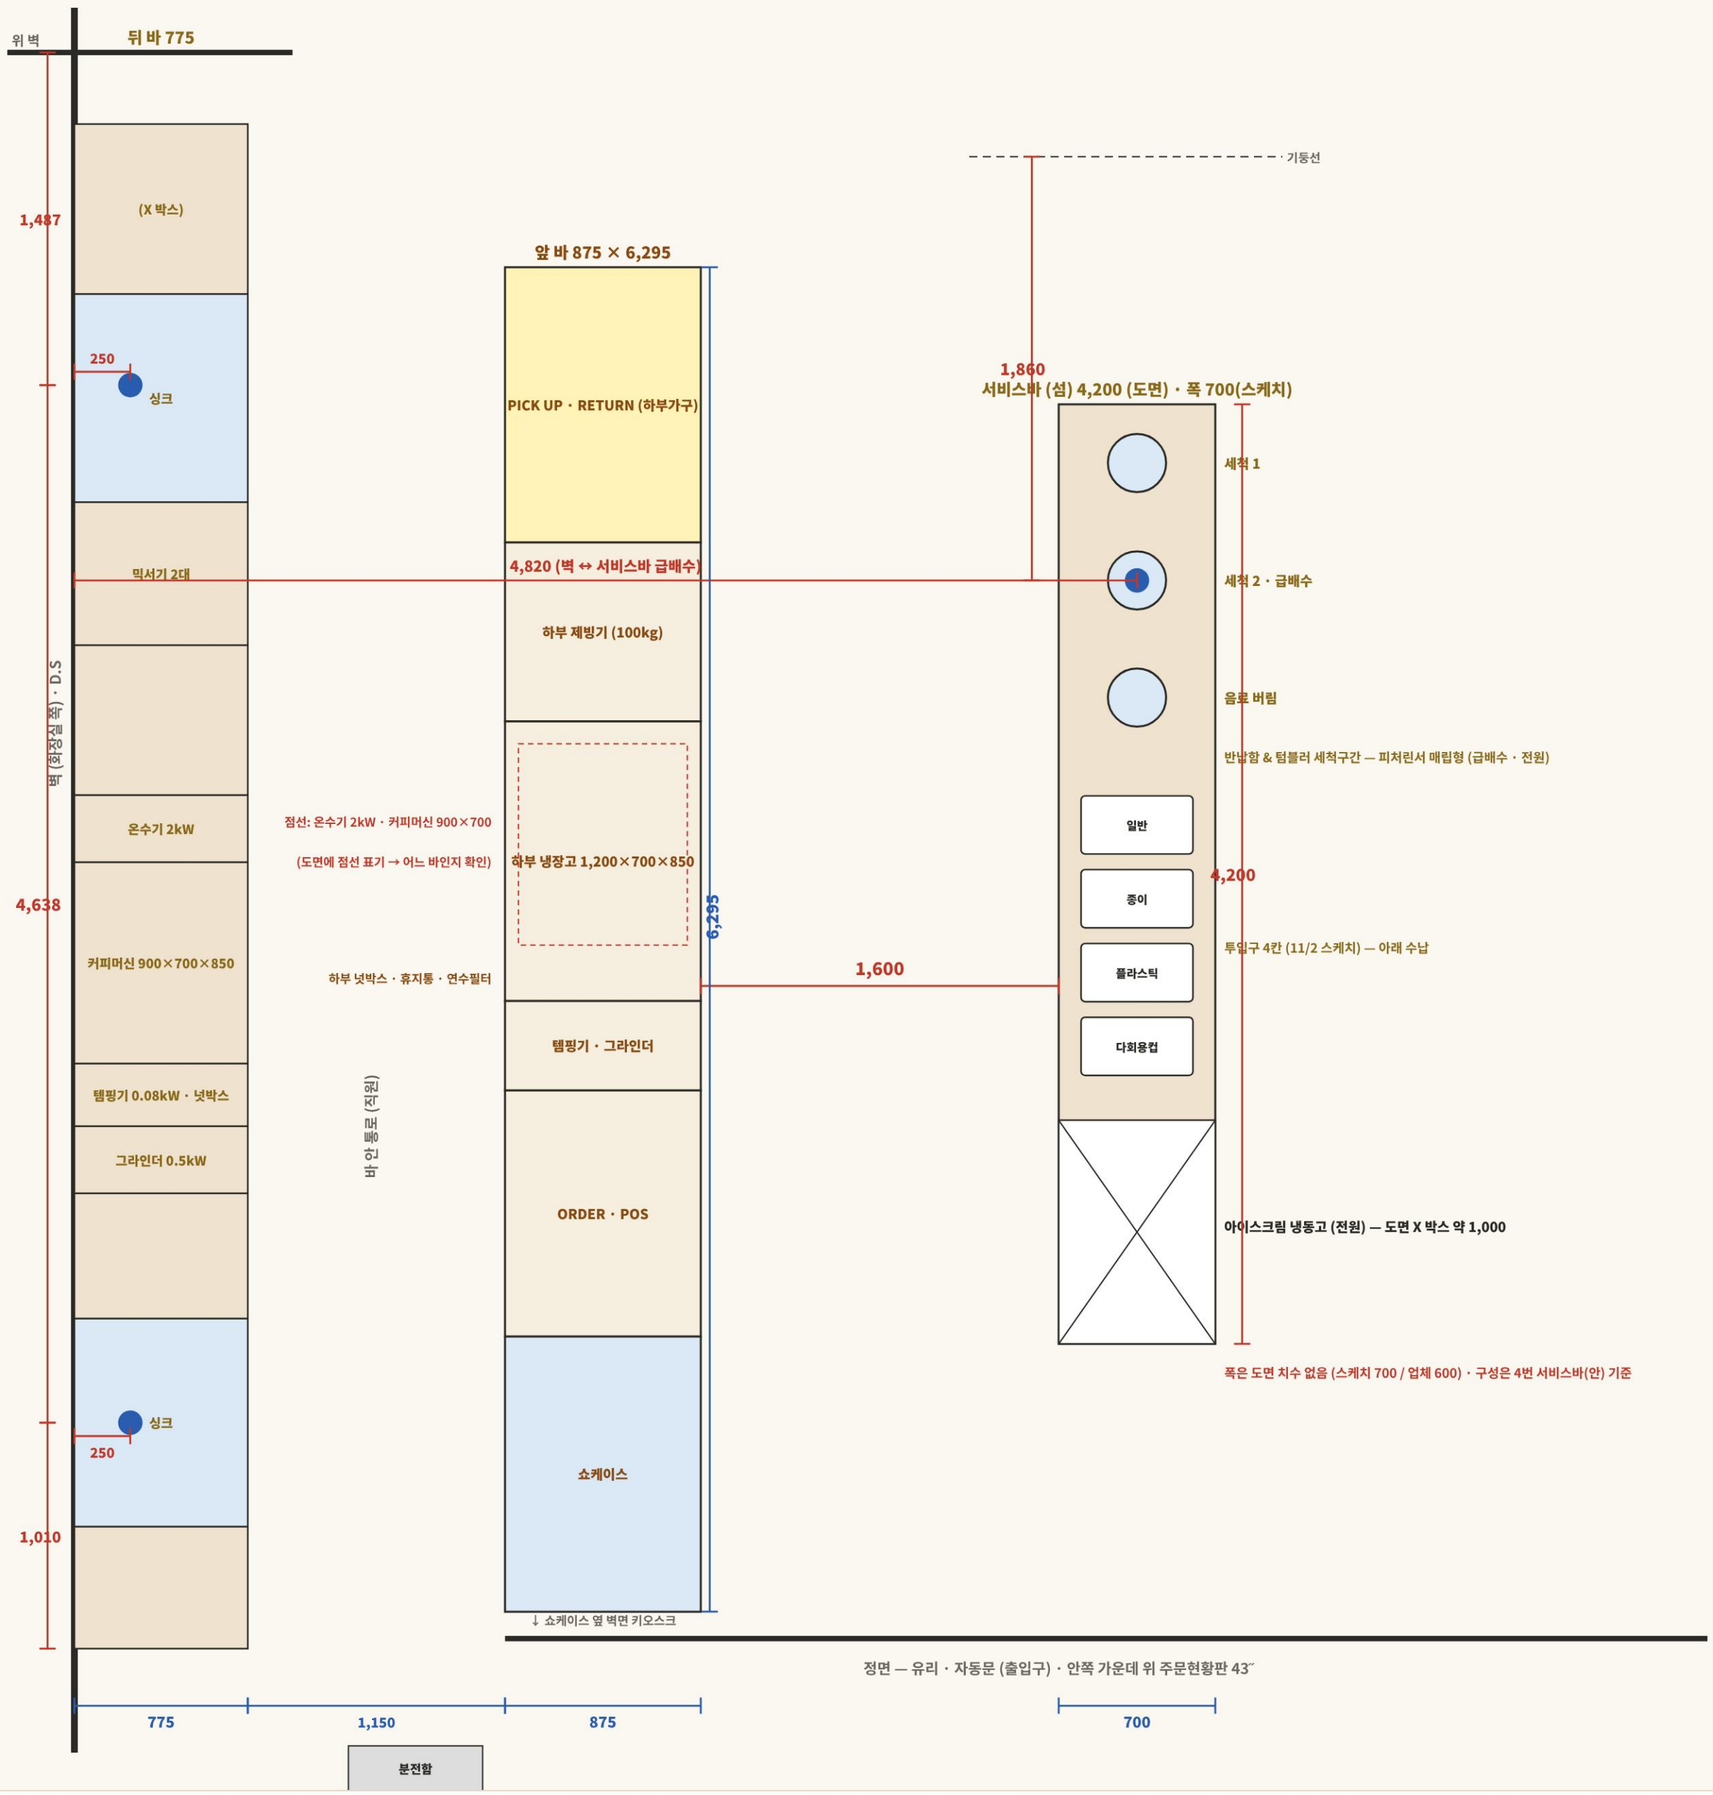

평면(11/3): 뒤 바 — 싱크(위 벽에서 1,487) · 믹서기 2 · 온수기 · 커피머신 900×700×850 · 템핑기 · 그라인더 · 넛박스 · 싱크 (싱크 사이 4,638 · 벽에서 250 · 아래 끝까지 1,010) — 앞 바 — 쇼케이스 · ORDER(POS) · 템핑 · 그라인더 · 하부냉장고 · 하부제빙기 100kg · PICK UP RETU


서비스바 = 앞 바에서 1,600 떨어진 섬 · 길이 4,200(도면) · 반납함 & 텀블러 세척 · 피처린서 매립형(급배수 · 전원) · 아이스크림 냉장고(전원) — 뒤 바 싱크에서 4,820 · 기둥선에서 1,860

확인: 커피머신 · 온수기 어느 바인지(앞 바에 점선 표기) · 바 안 통로 폭 · 서비스바 폭 700/600 · 반납함 투입구는 서비스바에 매립인지 따로인지

⑥ 로뎀카페 앞 바 (안) — 3D 시안 칸 구성 · 11/3 평면 깊이

단위 mm · 깊이 875(평면) · 칸 구성 · 하부 수납은 3D 시안 그대로 (1,230 · 500 · 500 · 400 · 1,250 · 800 · 868 · 500 = 6,048 + 50 · 3D 표기 6,945 · 평면 6,295) · 빨간 글씨 = 확인할 것

① 위에서 본 모습 — 손님 기준

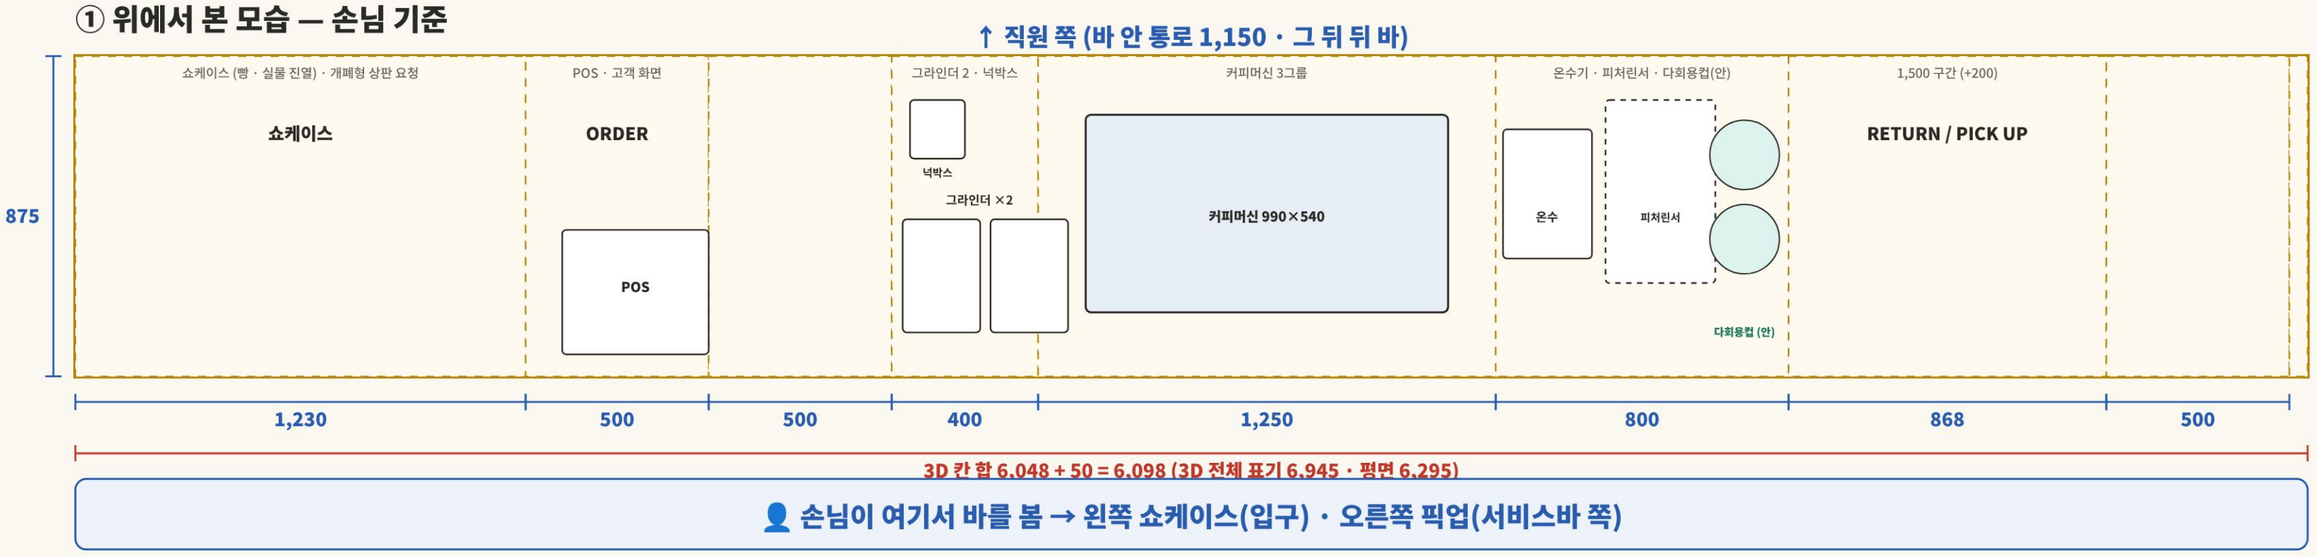

② 바 안에서 직원이 서서 본 모습 — 왼쪽 픽업 · 오른쪽 쇼케이스



3D 시안 「앞 바」: 쇼케이스 1,230 · 오픈장 500(ORDER · POS) · 3단 서랍장 500 · 오픈 400(넉박스) · 1200 냉장고 1,250 · 하부 제빙기 800 · 오픈장 868 · 2단 오픈장 500 · 끝 50 — RETURN/PICK UP 1,500(+200) · 상판 860

평면(11/3): 깊이 875 · 길이 6,295 = 1,230 · 1,100 · 400 · 1,250 · 800 · 1,215 (사이 60×5) — 순서는 3D와 같음


확인: 3D 칸 합 6,098 vs 평면 6,295 (ORDER 1,100 = 오픈장 500 + 서랍장 500 + 사이?) · 커피머신 · 온수기 어느 바 · 상판 높이 860 / 바깥면 1,050

상판 위 기기는 10/20 견적 기종 치수 · 하부 수납 형태는 3D 시안 그대로 · 다회용컵 자리는 안

⑦ 로뎀카페 뒤 바 (안) — 11/3 최종 도면 기준

단위 mm · 깊이 775(평면) · 칸 구성 · 하부 수납은 3D 시안 그대로 (600 · 950 · 400 · 350 · 1,250 · 450 · 950 · 736 · 889 = 6,575 · 3D 표기 6,945) · 빨간 글씨 = 확인할 것

① 위에서 본 모습

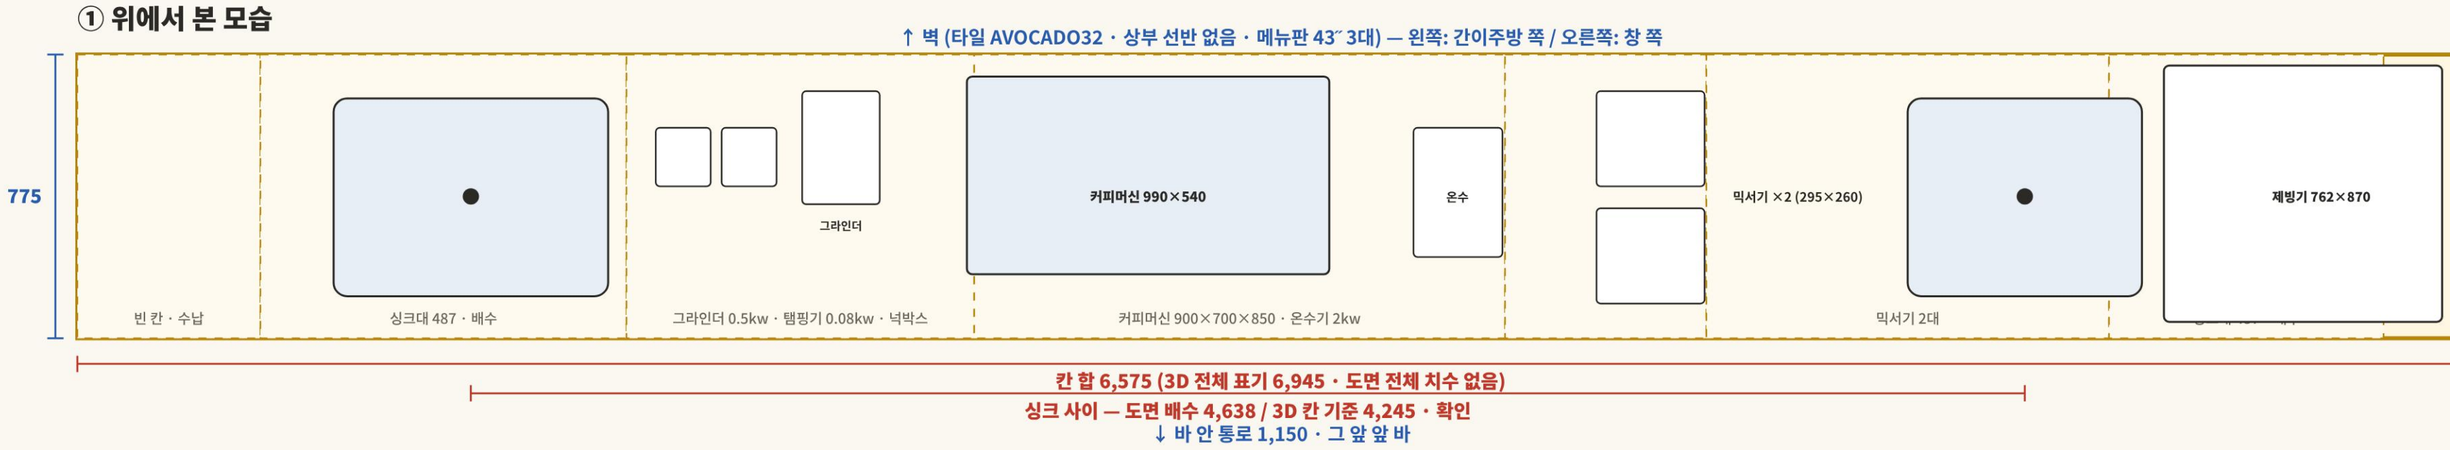

② 바 안에서 직원이 벽을 보고 선 모습 — 상판 위 기기 · 아래 수납



도면에서 읽은 것: 깊이 775 · 위 벽에서 첫 싱크 배수 1,487 · 싱크 배수 사이 4,638 · 아래 싱크에서 끝 1,010 · 기기 순서 (간이주방 쪽부터) 싱크 → 그라인더 · 탬핑 · 넉박스 → 커피머신 · 온수기 → 믹서기 2 → 싱크

확인: 3D(싱크 사이 약 4,245 · 제빙기 스탠드 뒤 바)와 평면(싱크 4,638 · 제빙기 앞 바 하부)이 다름 — 어느 것이 최종인지 · 커피머신 어느 바 · 상판 860(3D) / 924(ELE.02')

벽 마감은 11/2 회의 · 뒤 바 상부 선반 없음(3D 선반 2,300×300 무시) · 상판 위 기기는 10/20 견적 기종 치수

⑧ 뒤 바 — 벽 정면 (직원이 서서 보는 벽) · 도면 ELE.02' REV.5 (10/21) 치수

단위 mm · 전체 9,995 = 슬라이딩도어 쪽 2,870 + 7,125 · 하부장 924 · 콘센트 간격 285~900 · 메뉴판 2,910×558 (상판 위 997) · 타일 벽 · 상부 800




도면 ELE.02' REV.5(10/21): 9,995 = 2,870 + 7,125 · 슬라이딩도어 2,400(OPEN TO 카페 창고) · 하부장 924 · 1200 냉장고 · 900 냉동고 · 752 제빙기(점선) · 콘센트 220V 상판 위 200, 간격 285 · 1,950 · 830 · 918 · 1,725 · 900 · 메뉴판 2,910×558 상판 위 997

입면도라 문이 벽과 같은 면으로 보임 — 실제는 바 안 통로 끝 측면에서 옆으로 미는 문 · 하부장 칸 너비는 도면에 치수 없음(그림은 비율)

확인: 하부장 각 칸 너비 · 커피머신 자리(견적 990 폭) · 제빙기 752 스탠드(뒤 바) vs 언더카운터(앞 바) · 메뉴판 위치(앞 바 ELE.02에도 표기)

⑨ 앞 바 반대편 끝 벽 (서비스바 쪽) — 도면 ELE.04 치수

단위 mm · 9,313 = 7,906 + 1,407 (+323) · 높이 4,263 = 상부 800 + 루버 띠 600 + 2,863 · 붙박이 쇼파 7,906 연속(등받이 4구간) · 갤러리 도어 805(쇼파 위) · 1,287(바닥~2,400)

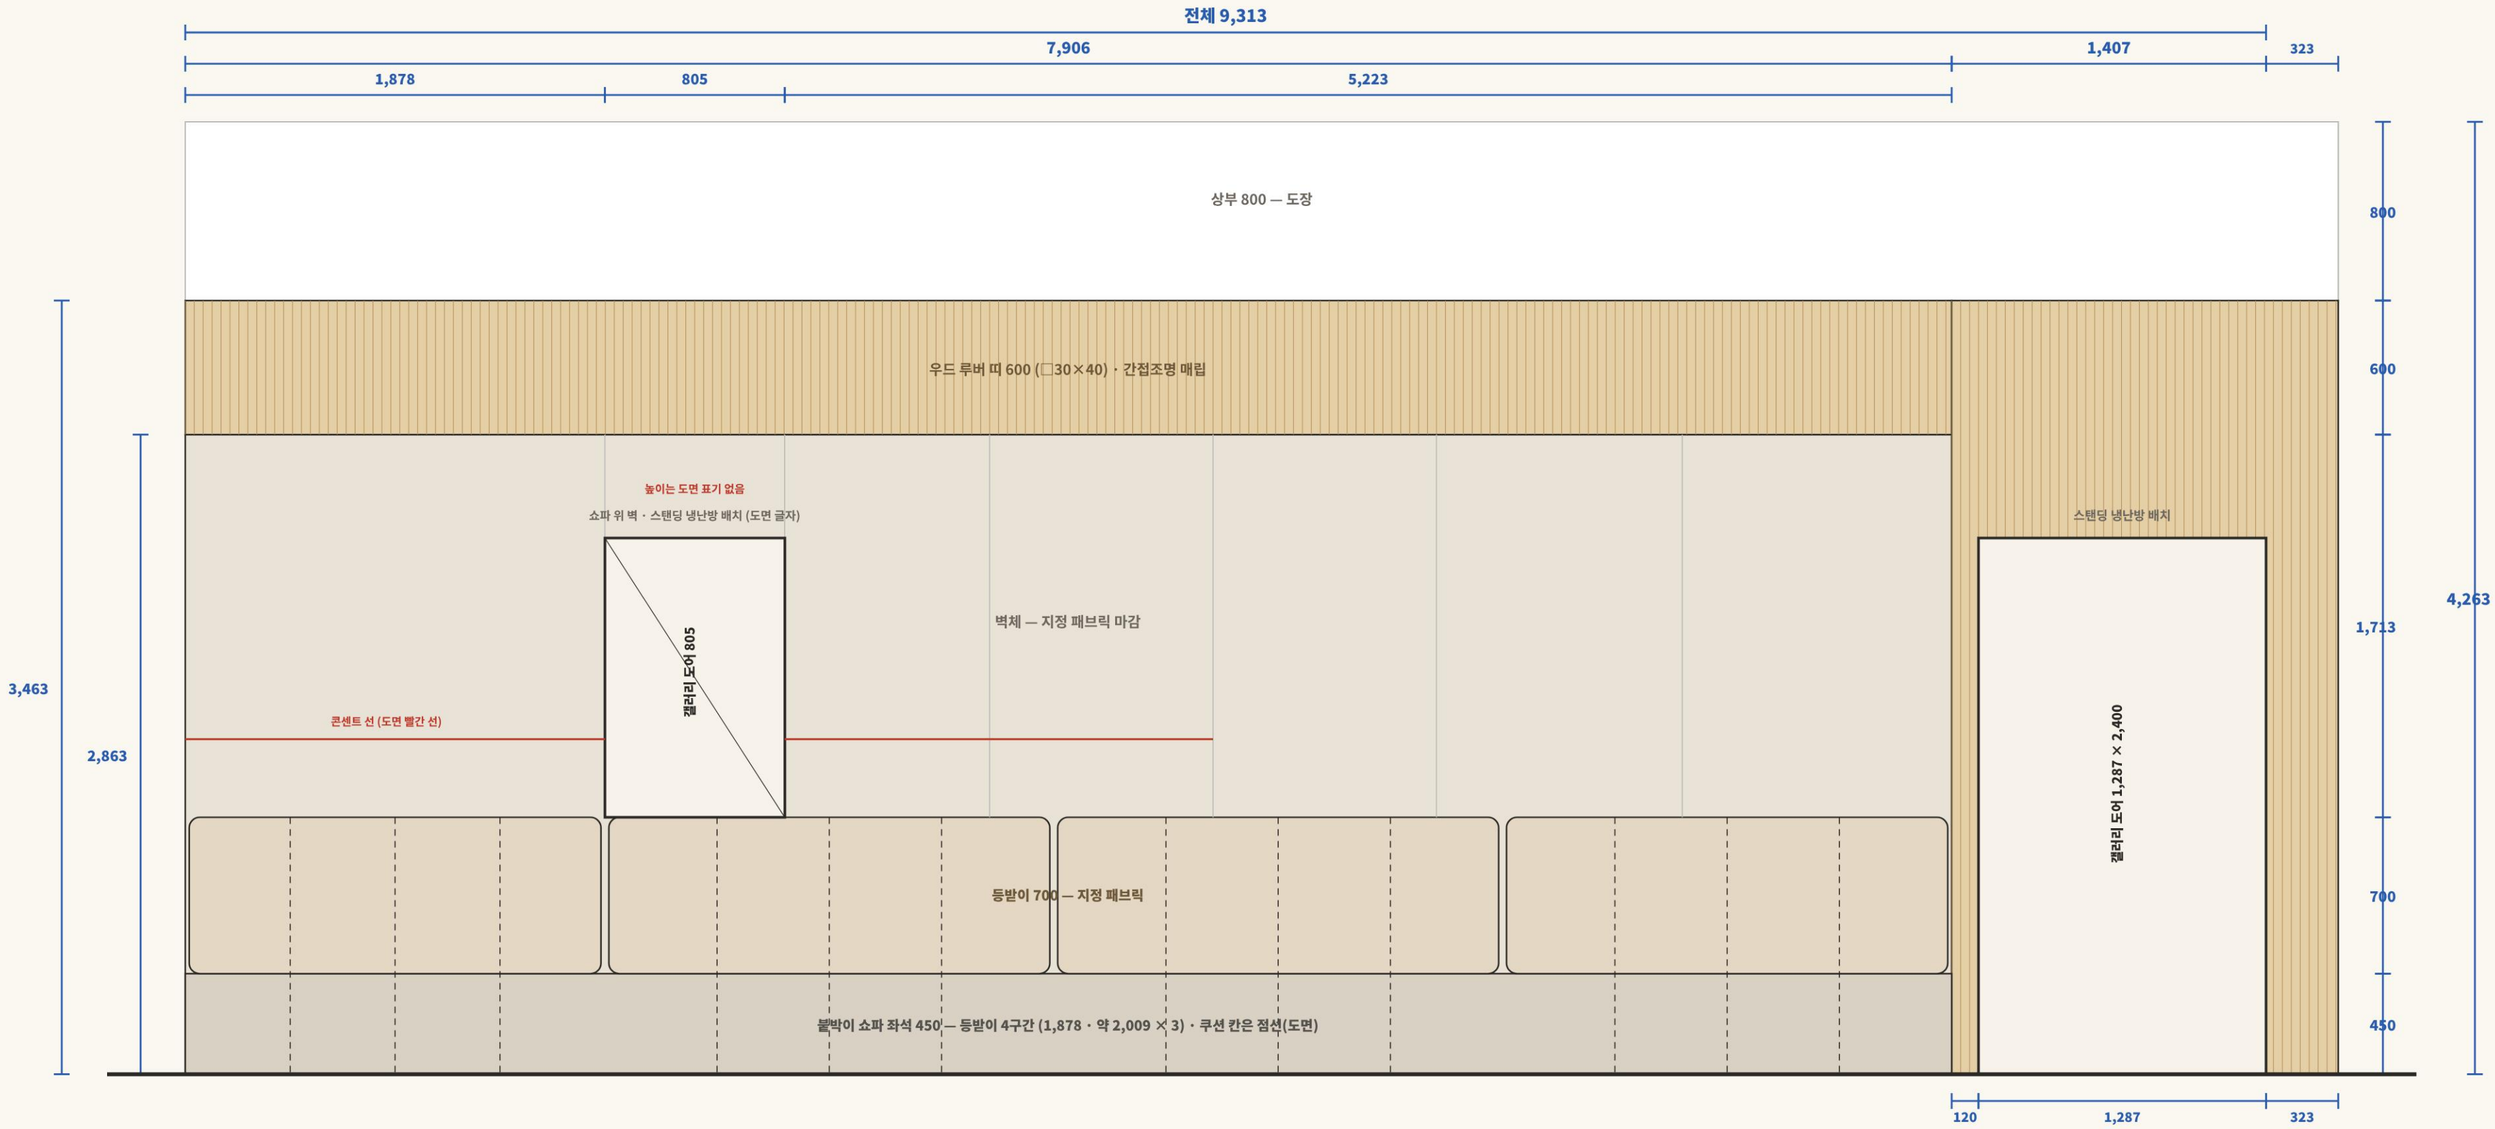


도면 ELE.04: 9,313 = 1,878 · 805(갤러리 도어 · 쇼파 위) · 5,223 | 1,407(120 · 갤러리 도어 1,287 × 2,400) · 323 — 높이 800 + 루버 600 + 2,863 (쇼파 좌석 450 + 등받이 700 + 1,713) · 쇼파는 7,906 전체 연속

확인: 왼쪽 갤러리 도어 805의 높이(도면 표기 없음) · 등받이 4구간 길이(1,878만 표기, 나머지 비율) · 이 벽은 쇼파 — 서비스바는 앞 바에서 1,600 떨어진 섬

⑩ 로뎀카페 간이주방 (안) — 11/3 최종 도면 기준

단위 mm · 위에서 본 모습 · 치수는 11/3 실시설계 평면 · 냉동(장)고 = 10/20 계약 기종 1,260×800×1,900 · 빨간 글씨 = 확인할 것

위에서 본 모습 (위가 뒤 바 · 바 안 통로 쪽 · 아래가 정면 유리 쪽)

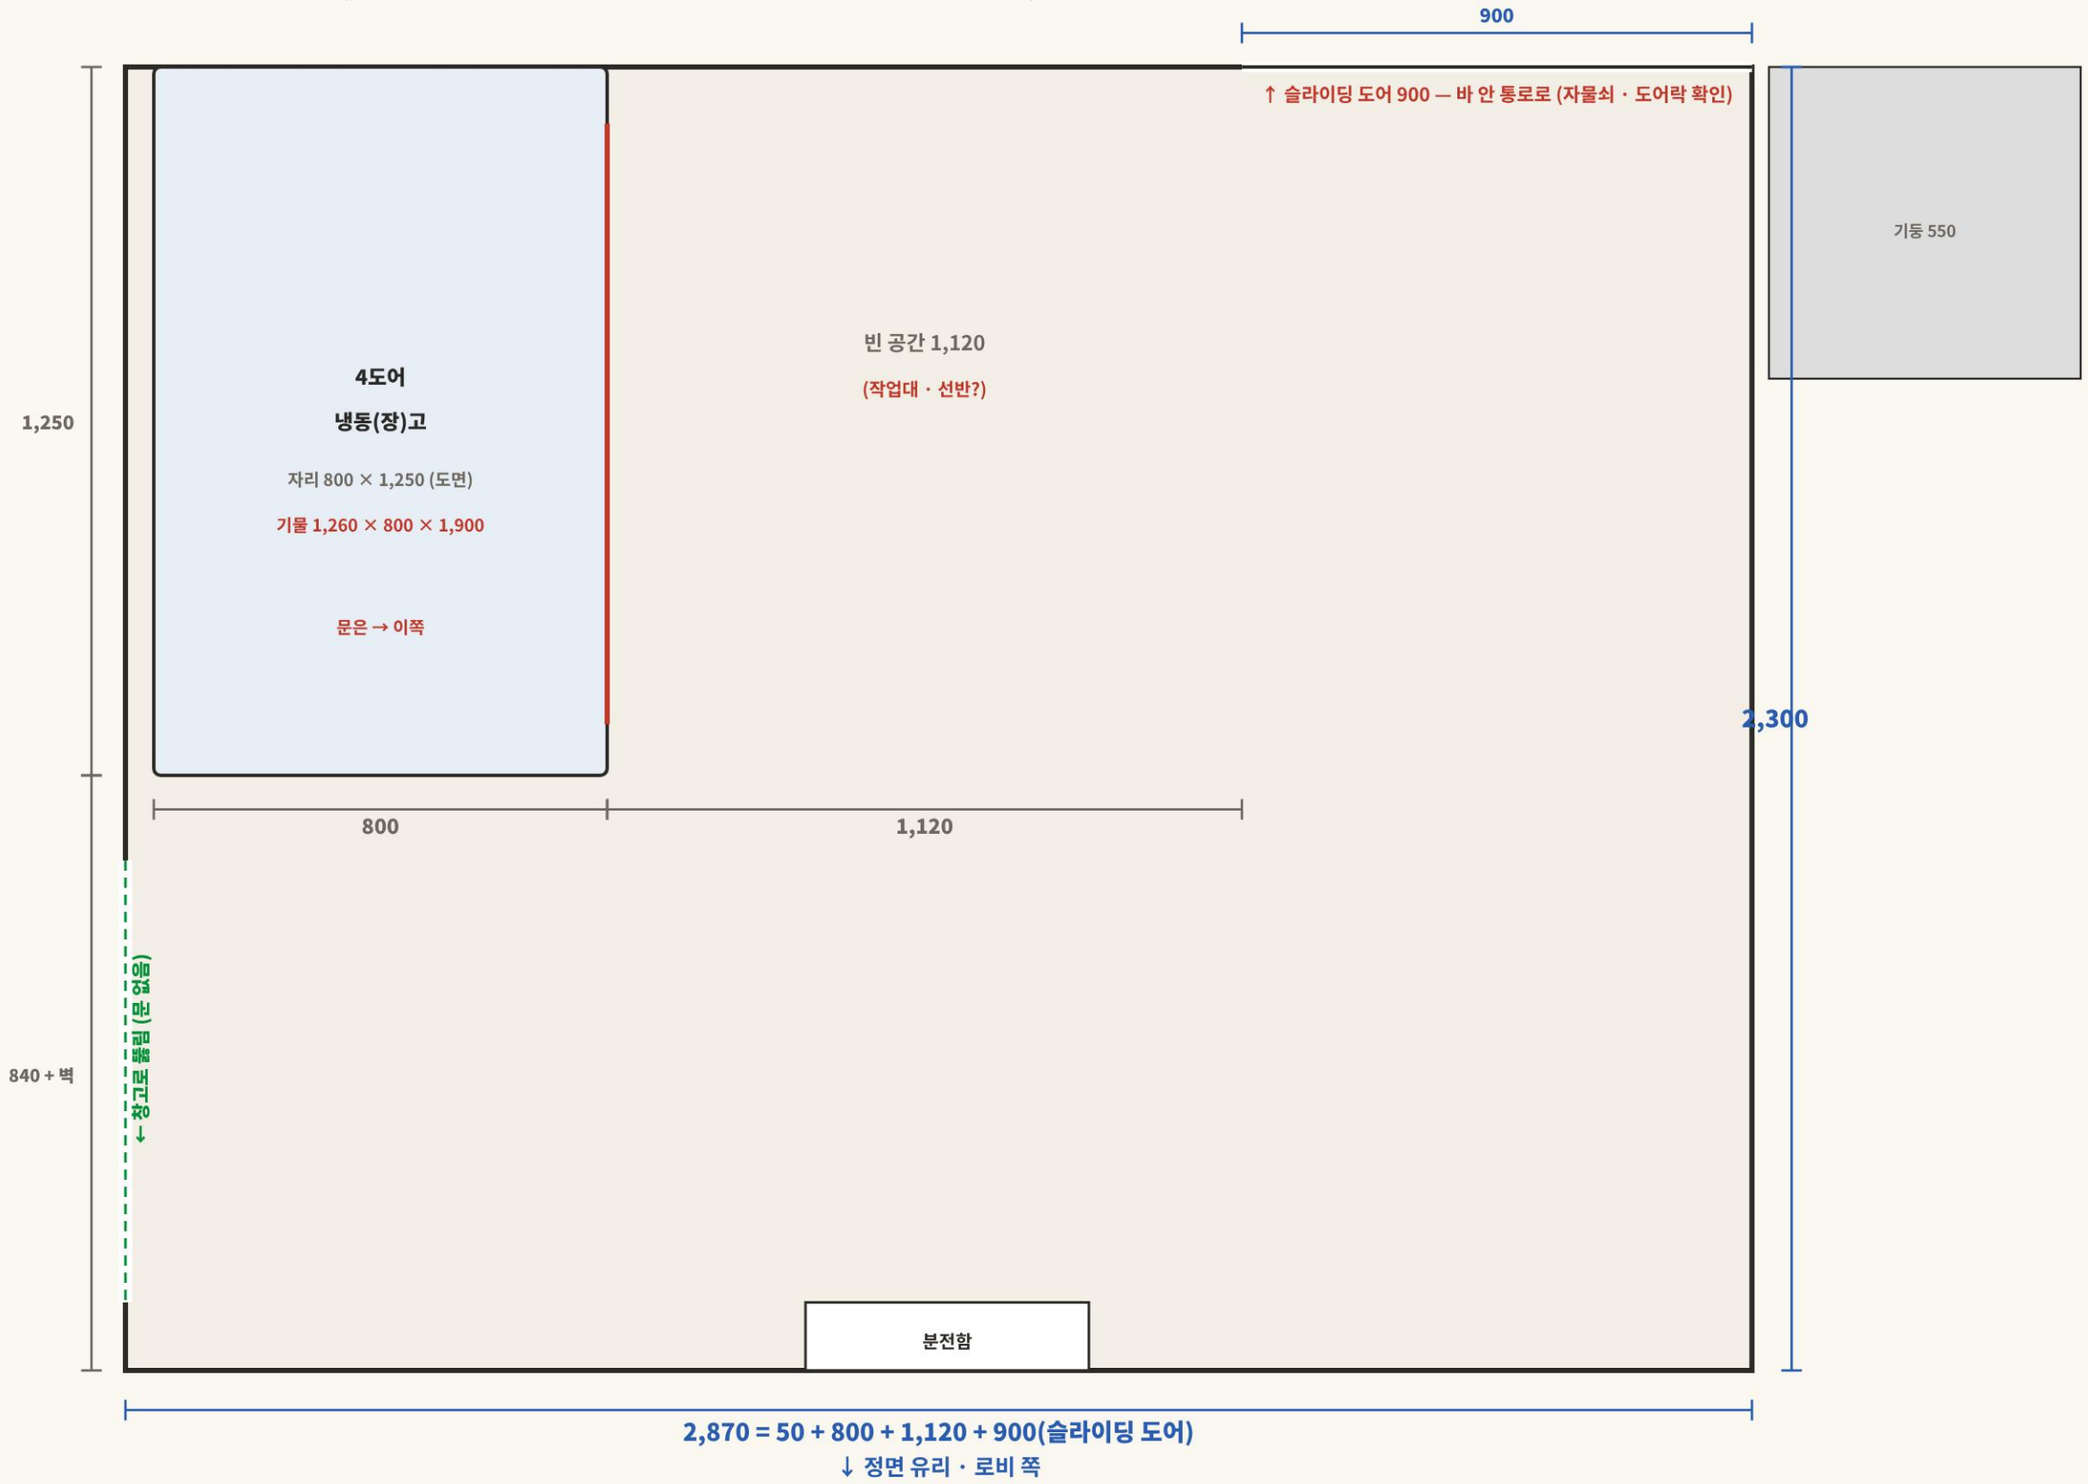

도면: 간이주방 2,870 × 2,300 = 50 · 냉동(장)고 자리 800 × 1,250 · 빈 공간 1,120 · 슬라이딩 도어 900 · 기둥 550은 바깥 · 냉동고 아래 840

창고 1,670 × 1,971 (323 + 앵글장 398 + 1,250) · 왼쪽 벽 문 875

계약 기종 1,260 × 800 × 1,900 → 자리 800 × 1,250에 세로로 — 1,260이 1,250보다 10 큼 · 확인

11/4 확인: 바깥 문 밖으로 열림(도면 호는 안쪽) · 앵글장 자리 맞음 · 오른쪽은 간이주방으로 뚫림 · 아무것도 안 둠


확인: 냉동고 1,260 vs 자리 1,250 · 선반 제작 위치(간이주방 빈 공간 1,120?) · 바 쪽 문 자물쇠

위 = 뒤 바 · 바 안 통로 쪽 · 아래 = 정면 유리 쪽 · 창고 왼쪽 문은 화장실 쪽 복도로 열림

⑪ 로뎀카페 창고 (안) — 11/3 최종 도면 기준

단위 mm · 위에서 본 모습 · 치수는 11/3 실시설계 평면 · 냉동(장)고 = 10/20 계약 기종 1,260×800×1,900 · 빨간 글씨 = 확인할 것

위에서 본 모습 (위가 뒤 바 · 바 안 통로 쪽 · 아래가 정면 유리 쪽)

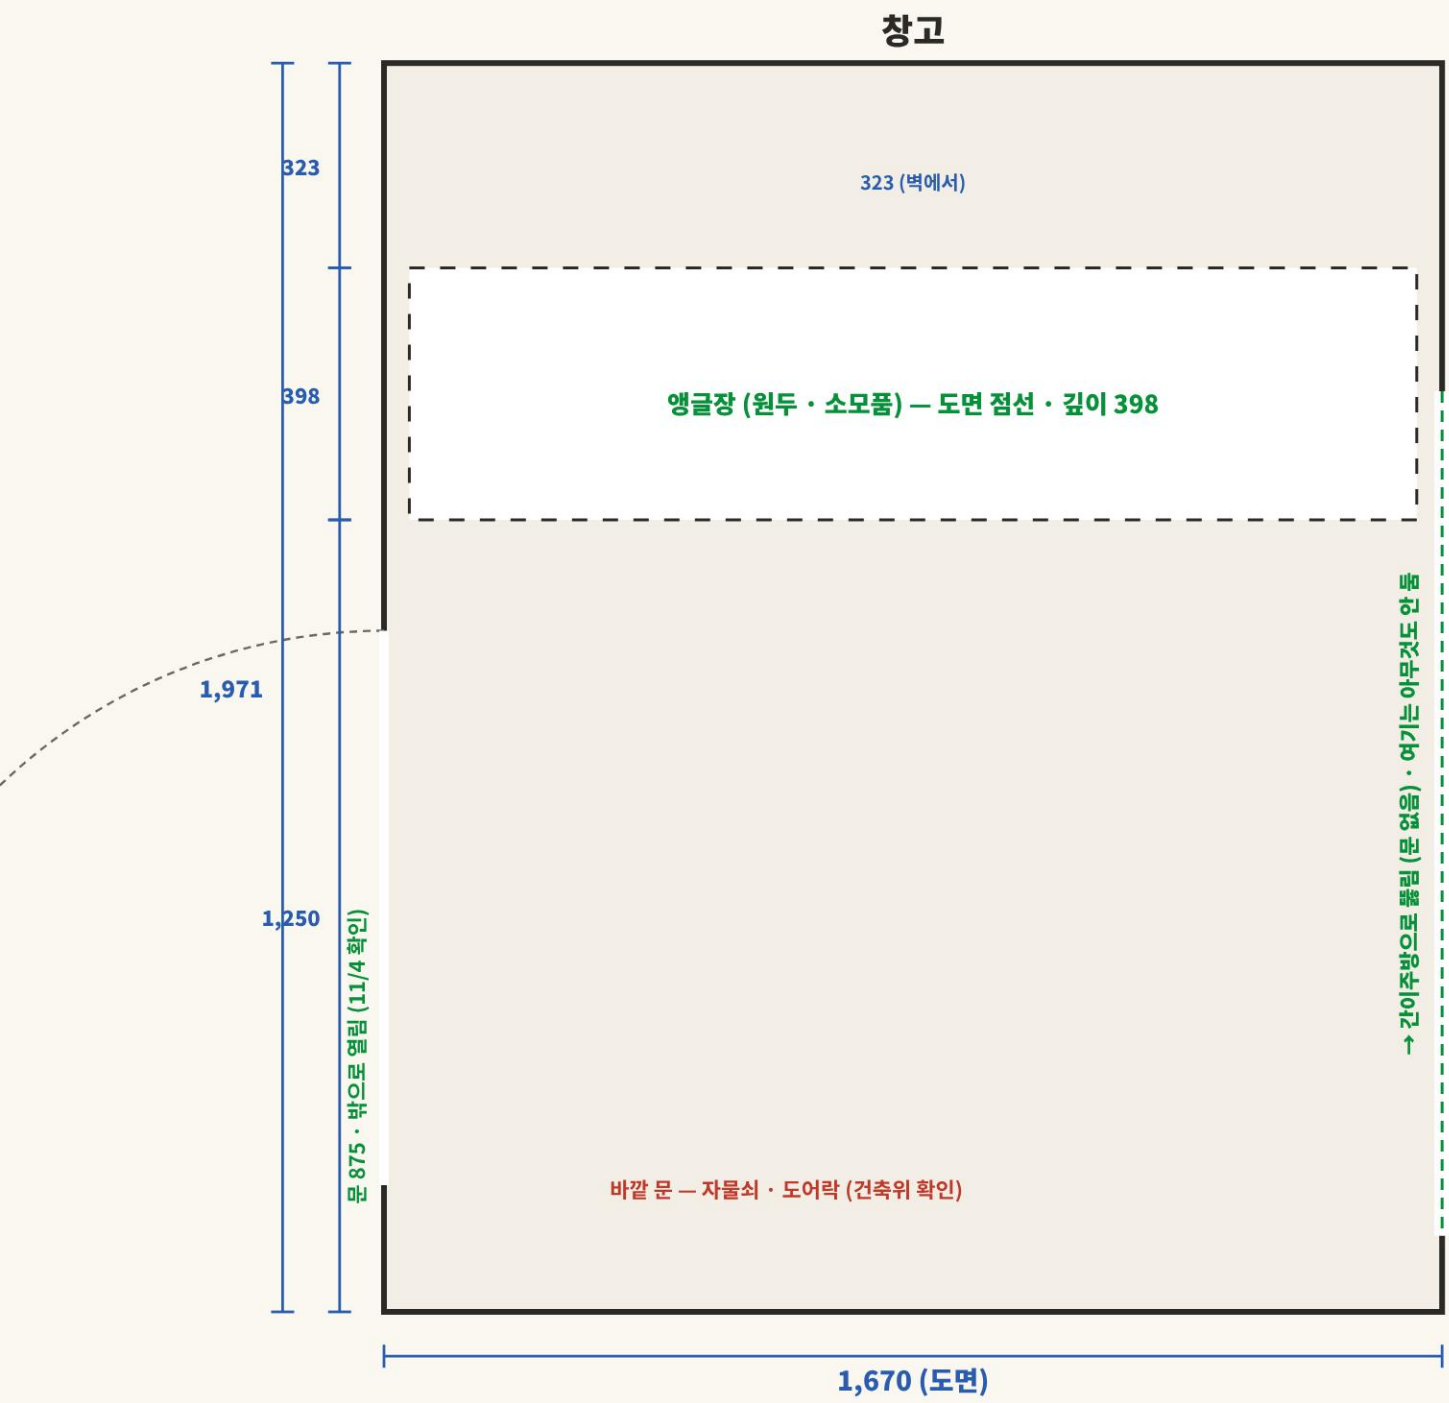

도면: 간이주방 2,870 × 2,300 = 50 · 냉동(장)고 자리 800 × 1,250 · 빈 공간 1,120 · 슬라이딩 도어 900 · 기둥 550은 바깥 · 냉동고 아래 840

창고 1,670 × 1,971 (323 + 앵글장 398 + 1,250) · 왼쪽 벽 문 875

계약 기종 1,260 × 800 × 1,900 → 자리 800 × 1,250에 세로로 — 1,260이 1,250보다 10 큼 · 확인


11/4 확인: 바깥 문 밖으로 열림(도면 호는 안쪽) · 앵글장 자리 맞음 · 오른쪽은 간이주방으로 뚫림 · 아무것도 안 둠

확인: 냉동고 1,260 vs 자리 1,250 · 선반 제작 위치(간이주방 빈 공간 1,120?) · 바 쪽 문 자물쇠

위 = 뒤 바 · 바 안 통로 쪽 · 아래 = 정면 유리 쪽 · 창고 왼쪽 문은 화장실 쪽 복도로 열림

⑫ 카페 창 쪽 벽 — 도면 ELE.03 REV.4 (10/21) 치수

단위 mm · 전체 16,416 · 높이 4,263 = 상부 800(아치) + 3,463 · 신규 창호 3곳 (1,670 · 6,088 · 1,695) · 창 높이 2,400 + 80 + 963

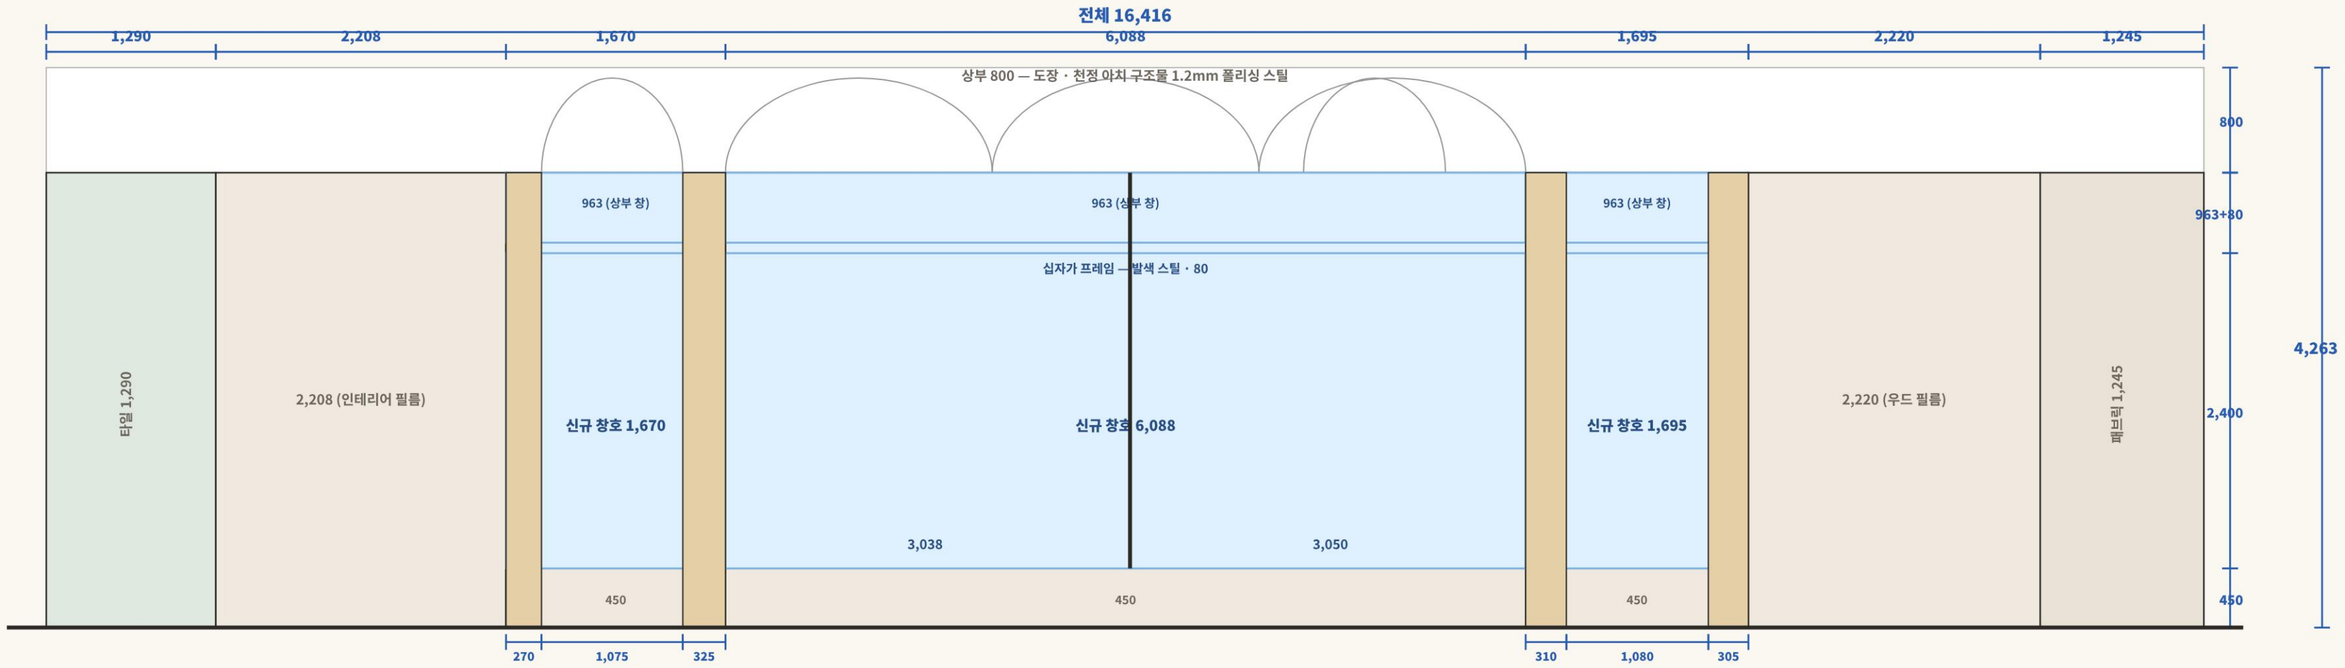


도면 ELE.03 REV.4(10/21): 16,416 = 타일 1,290 · 2,208 · 창 1,670(270 · 1,075 · 325) · 창 6,088(3,038 · 80 · 3,050) · 창 1,695(310 · 1,080 · 305) · 2,220 · 패브릭 1,245 — 창 높이 450 + 2,400 + 80 + 963

확인: 블라인드 없음(11/3) · 창 쪽 테이블 배치 · 서점 쪽 벽인지(1,245 패브릭 쪽) 확인

6 마감 · 색

공사 예산 안에서 업체가 고른 자재

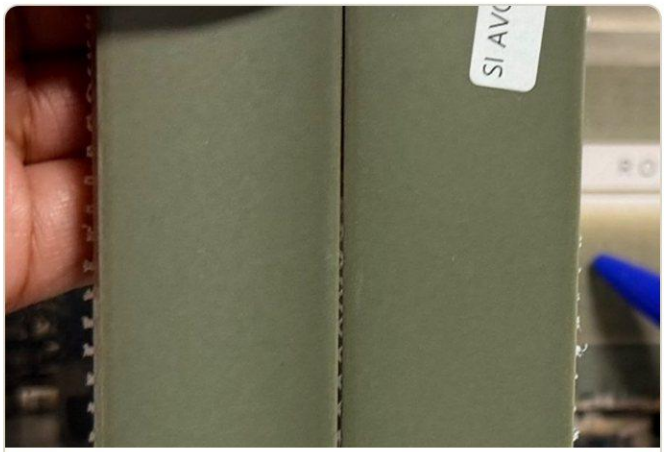


뒷벽 타일 · SI AVOCADO32
올리브 그린 · 3D의 뒷벽 색



상판 · LX 하이막스
베이지 바탕에 돌 조각 · 원래 원한 진한 색은 단종



3D 시안
RODEM CAFE 사인 · 그린 타일 · 우드 테이블 · 레일등

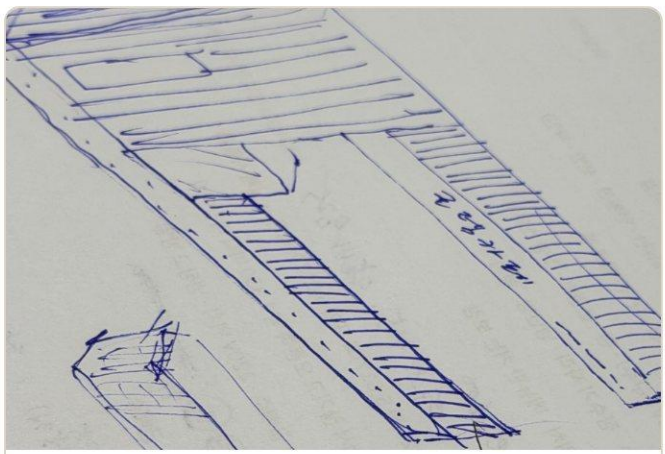

앞 바 마감 스케치
아래 돌 · 위 루바 · 옆으로 돌아 들어감

앞 바 전면	아래 **회색 자연석(잔다듬)** · 위 **루바** — 본당 완공 때 쓴 소나무 루바를 다시 씀 (거친 질감 그대로 · 전통을 잇는 의미)
바닥	타일 (LX 하이막스와 같은 등급 안에서 선택) · 녹색 계열
벽	뒷벽 그린 타일 · 한쪽 거울(넓어 보이게) · 시트지 · 문은 포켓도어 검토 중
사인 · 조명	「로뎀카페」 한글 + 영어 · 레일등 · 간접조명 · 메뉴판 위 숨은 수납장
색 톤	**교회 그린은 쨍함 → 톤 다운 · 앞치마 · 컵홀더 색은 3D 받고 결정 (단장님 · 조소은 집사님)**

⑭ 11/2 현장 회의 결과 — 그 뒤 결정된 것까지 반영 (11/4)

초록 = 확정 · 파랑 = 회의 뒤 결정됨 · 빨강 = 아직 확인 · 회색 = 참고

확정 (11/2 회의)

- 바 깊이 뒤 775 · 앞 875 (CAD) · 앞 바 길이 6,295 · 통로 1,150
- 서비스바 4,200 · 앞 바에서 1,600 · 쓰레기 칸 4(일반 · 종이 · 플라스틱 · 다회용컵)
- 키오스크 1대 · 무선 (잇다) · 쇼케이스 옆 벽면 매립
- 메뉴판 43″ 3대 — 뒤 바 위 · 보강은 업체
- 콘센트 — 도면 표시대로 최대한
- 창고 문 밖으로 열림 (11/4 확인) · 선반은 공사 범위 아님
- 기물 · 가구 반입 11/14(토) · 의자 — 업체 거래처 · 개당 7만원 선

회의 뒤 결정됨 (11/3 ~ 11/4)

- 주문현황판 43″ · 정면 벽 안쪽 가운데 위 · 가로 · 픽업존 아님
- 텀블러 세척기 2구 (도면 원 3개 중 1개는 음료 버리는 곳)
- 다회용컵 반납함 — 사업단 비용 · 5대 (자리는 단장님 확인 중)
- 매장 다회용컵 + 외부용 일회용컵
- 뒤 바 상부 선반 없음 · 블라인드 없음 · 우드톤 · 루버
- 창고 오른쪽은 간이주방으로 문 없이 뚫림 · 앵글장 자리 확정
- 3D 최신본 없음 — 11/3 도면 · 이미지가 최신

아직 확인

- 서비스바 폭 600 / 700 · 높이 · 반납함 투입구가 서비스바 매립인지
- 커피머신 · 온수기 어느 바인지 (도면 양쪽 표기) · 견적 990이 자리 900보다 넓음
- 상판 높이 — 3D 860 / ELE.02 1,050 / ELE.02' 924
- 앞 바 쇼케이스 아래 마감 · 오른쪽 끝 900 구간
- 현황판 "가운데" 기준 · 호출음 스피커 · 인터넷 회선 (사무국)
- 창고 · 간이주방 도어락 — 건축위 / 사업단 구매
- 선반 제작 자리 (창고 오른쪽 못 둠 → 간이주방 1,120?) · 냉동고 1,260 vs 자리 1,250

사업단이 준비 · 받을 자료

- 컵 건조대 · 창고 선반 · 도어락(업체가 못 하면) · 안내물(벽에 붙이지 않기)
- 천장 · 조명 도면 · 입면도 (ELE.01~04 받음) · 설비 도면 없음(급수 3곳만)
- 서점(같은 미팅): 카드 쓰는 곳 밖 · 깊이 약 200 · 길이 · 높이 알려 달라 함
- 서점 창고 문 슬라이딩(포켓) — 업체 확인 · 입구 신간 진열대 사각 권장 — 사업단 회의 전
